

خبرنامه آموزشی شرکت پروژه یارماس تبریز آذر ۹۴

بروزرسانی پیشرفت فیزیکی پروژه با physical % complete

تهیه کننده بهنام کمالی منبع: **M P you G**

جهت دریافت خبرنامه های آموزشی در سایت WWW.PMTCT.IR ثبت نام نمایید.

۱. با توجه به این کلیه مقادیر این ستون به شکل دستی وارد می شود و محاسبه خلاصه این فیلد در نرم افزار با مشکلاتی همراه است فرمول اصولی و علمی برای محاسبه آن وجود ندارد.
۲. جهت حل مشکل اشاره شده در ردیف ۱ به شکل زیر عمل می کنیم.
۳. پروژه های با ۳ فعالیت و زمانهای دوروزه به شکل FS تعریف نمایید. تاریخ شروع پروژه ۲۴ آگوست ۲۰۱۵ می باشد. ستونهای %Complete و Physical % Complete را وارد نمایید.
۴. سه ستون به نامهای number1 , number2 , number3 ایجاد نمایید.
۵. عناوین آنها را به ترتیب “physically finished weight”, “physically finished%”, “weighted worth” نامگذاری نمایید.

Field Settings

Field name: Number1

Title: WEIGHTED WORTH

Align title: Left


Align data: Left

Width: 20 Header Text Wrapping


Best Fit OK Cancel

خبرنامه آموزشی شرکت پروژه یارماس تبریز ۹۴

۶. Weighted Worth مقادیر وزنی فعالیت هاست که به شکل دستی وارد می گردد. Rull Up را از نوع Sum انتخاب نمایید.
۷. فیلد physically finished weight حاصلضرب مقدار Physical % Complete در weighted worth می باشد. برای محاسبه این مقدار نیاز به فرمول نویسی به شرح ذیل داریم. برای فیلد فوق نیز Rull Up را از نوع Sum انتخاب نمایید.

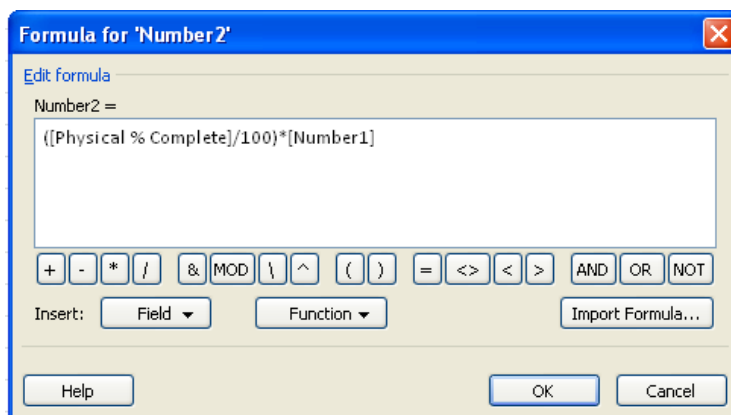

۸. فیلد physically finished% پیشرفت فیزیکی جدید را بر مبنای وزن دهی انجام شده مجدداً محاسبه می کند. برای محاسبه این ستون مقدار موجود در ستون physically finished weight را بر weighted worth تقسیم می کنیم.

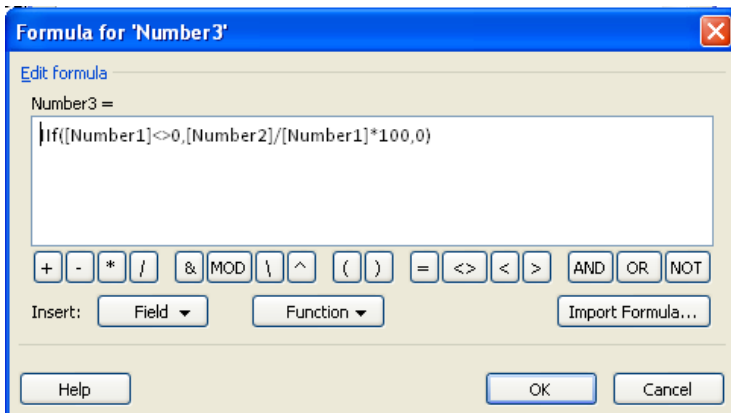

خبرنامه آموزشی شرکت پروژه یارماس تبریز آذر ۹۴

۹. تنظیمات زیر را برای این فیلد به شکل زیر انجام دهید.

The screenshot shows the 'Custom Fields' dialog box with the following settings:

- Field:** Number3
- Type:** Number
- Custom attributes:** Formula...
- Calculation for task and group summary rows:** Use formula

پروژه را به تاریخ ۲۸ آگوست ۲۰۱۵ بروزرسانی نمایید.

۱۰. مقدار محاسبه شده در این فیلد رقم مطمئن تری نسبت به %Complete در اختیار مدیران و برنامه ریزان پروژه قرار می دهد.

physical%com.mpp - Microsoft Project (Product Activation Failed)

Task ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Physical % Complete	WEIGHTED WORTH	PHYSICAL FINISH	physical finish %
1	A	6 days	Mon 8/24/15	Mon 8/31/15	83%	0%	90	65	72.22
2	1	2 days	Mon 8/24/15	Tue 8/25/15	100%	100%	20	20	100
3	2	2 days	Wed 8/26/15	Thu 8/27/15	100%	100%	20	20	100
4	3	2 days	Fri 8/28/15	Mon 8/31/15	50%	50%	50	25	50
